

**Отчет о результатах контрольного мероприятия
по проверке целевого и эффективного использования средств
Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития
инженерных сетей Республики Татарстан за 2010-2012 годы**

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.9), распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 10.01.2013 № ВА-8.

Цель контрольного мероприятия:

- установление соответствия деятельности организации требованиям законодательства, положениям учредительных документов;
- оценка эффективности деятельности организации, достижения целей и задач, поставленных перед ней.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан, учредительные или иные документы, характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта; договоры на выполнение работ и оказание услуг; акты выполненных работ; финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность.

Объект контрольного мероприятия: ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан», ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан», ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан».

Проверяемый период: 2010-2012 годы.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

***Фонд газификации, энергосберегающих технологий
и развития инженерных сетей Республики Татарстан***

Государственное казенное учреждение «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (далее – Фонд) действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Фонд создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №660 от 17.08.2010 «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений Республики Татарстан, создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан».

Функции учредителя Фонда осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Целью деятельности Фонда является осуществление государственных функций в области энергосбережения, строительства и реконструкции инженерных сетей объектов жилищного, производственного, коммунального и социально-культурного назначения путем исполнения функций.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а.

Штатная и фактическая численность составляет семь человек.

В 2011-2012 годах на развитие систем водоснабжения, в том числе по программе «Чистая вода», выделены средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 1 274 093 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 72 882 тыс. рублей.

В 2010-2012 годах для строительства и реконструкции объектов газоснабжения и технического перевооружения систем газификации из республиканского бюджета выделены средства в общей сумме 473 985,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 379,0 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2010 год (ф. 0503127) исполнение расходов составило 150 000,0 тыс. рублей.

Средства в сумме 150 000,0 выделены из бюджета Республики Татарстан согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1685-р от 20.09.2010. Фонд по итогам проведенных торгов (в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ все торги признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки) заключил за счет выделенных средств 2010 года 41 государственный контракт на общую сумму 150 000,0 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками:

- ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (далее ГУ «УКС») – 40 контрактов на сумму 135 022,8 тыс. рублей;

- с единственным участником ООО «Стафит» – один контракт на сумму 14 977,2 тыс. рублей.

Согласно актам выполненных работ Фондом приняты объемы работ по 41 государственному контракту на общую сумму 150 000,0 тыс. рублей.

В бюджете Республики Татарстан на 2010 год средства на содержание аппарата Фонда не предусматривались. Фонд в 2010 году осуществлял внебюджетную деятельность. Внебюджетные средства в сумме 6 190,0 тыс. рублей направлены на управленческие расходы Фонда.

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2011 год (ф. 0503127) исполнение расходов составило 1 234 598,8 тыс. рублей.

Фонд по итогам проведенных торгов (в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ все торги признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки) заключил за счет выделенных средств 2011 года 23 государственных контракта на общую сумму 1 023 814,1 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками:

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – двенадцать контрактов на сумму 760 269,1 тыс. рублей;

- ООО «Раминвест М» – два контракта на сумму 78 283,7 тыс. рублей;

- ООО «ИС Радиант» – один контракт на сумму 70 645,0 тыс. рублей;

- ООО «Раминвест» – два контракта на сумму 61 800,1 тыс. рублей;

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 14 457,5 тыс. рублей;

- ООО «Ирбис» – один контракт на сумму 9 484,2 тыс. рублей;

- ООО «ГазАкваСтрой» – один контракт на сумму 7 989,5 тыс. рублей;

- ООО «ГазАвтоматика» – один контракт на сумму 7 904,0 тыс. рублей;

- ООО «ГазКомплектСервис» – один контракт на сумму 6 800,0 тыс. рублей;

- ОАО «Сетевая компания» – один контракт на сумму 6 181,0 тыс. рублей.

Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 08.02.2013 приняты объемы работ по 17 государственным контрактам на общую сумму 801 072,4 тыс. рублей.

В ходе проверки произведен возврат неиспользованных остатков средств в бюджет Республики Татарстан в сумме 1 404,1 тыс. рублей (КБК 713 0502 523100 310), в том числе выделенных по Распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан 845-р от 01.06.2011 – 355,0 тыс. рублей,

1848-р от 10.10.2011 – 395,2 тыс. рублей, 1026-р от 21.06.2011 – 47,7 тыс. рублей, 1094-р от 29.06.2011 – 606,2 тыс. рублей.

В бюджете Республики Татарстан 2011 года средства на содержание аппарата Фонда не предусматривались. Фонд в 2011 году осуществлял внебюджетную деятельность. Внебюджетные средства, полученные Фондом в сумме 10 818,4 тыс. рублей, направлены на управленческие расходы.

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2012 год (ф. 0503127) исполнение расходов составило 432 028,1 тыс. рублей.

Фонд по итогам проведенных торгов заключил за счет выделенных средств 2012 года 19 государственных контрактов на общую сумму 379 393,9 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками:

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – двенадцать контрактов на сумму 255 963,5 тыс. рублей;

- ООО «Архспецтехнопроект» – один контракт на сумму 289,8 тыс. рублей;

- ООО «ГазАкваСтрой» – два контракта на сумму 4 835,8 тыс. рублей;

- ООО «Раминвест М» – один контракт на сумму 59 301,0 тыс. рублей;

- ООО «Водгазпроект» – один контракт на сумму 4 237,3 тыс. рублей;

- ООО «ГазСервисАвтоматика» – один контракт на сумму 2 473,7 тыс. рублей;

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 52 292,8 тыс. рублей.

Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 08.02.2013 приняты объемы работ по 13 государственным контрактам на общую сумму 225 487,3 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность Фонда за 2010-2012 годы увеличилась в 38,3 раза и составила по состоянию на 1 января 2013 года 613 354,9 тыс. рублей (Таблице 1).

Таблица 1
тыс. руб.

на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013
29 486,5	16 684,6	985 843,5	613 354,9

Просроченная дебиторская задолженность на балансе фонда не числится.


Кредиторская задолженность Фонда перед контрагентами отсутствует.

В 2010-2012 годах на балансе Фонда основные средства (недвижимость, транспортные средства) отсутствовали. В 2012 году Фонд заключил с ООО «Офис-сити» договор аренды (№7 от 01.01.2012) нежилого

помещения площадью 91,0 кв. м. по адресу г. Казань, ул. Н. Ершова с ежемесячной суммой оплаты 72,3 тыс. рублей.


Стоимость вложений в недвижимое имущество (незавершенное строительство) составила на 1 января 2013 года 1 659 934,9 тыс. рублей (диаграмма 1).

Диаграмма 1

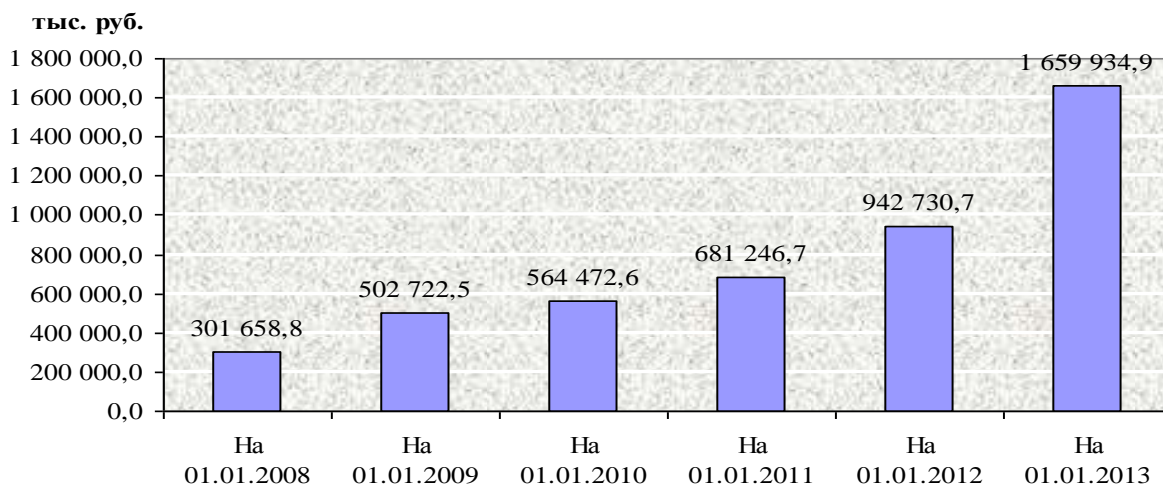

Информация о динамике количества незавершенных строительством объектов представлена в диаграмме 2.

Диаграмма 2

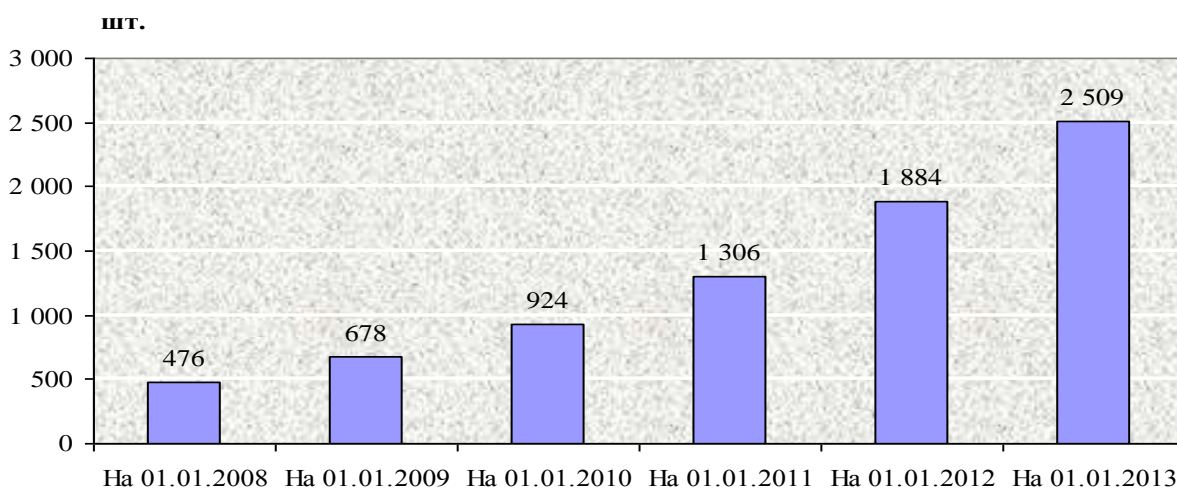

В 2010-2012 Фондом бухгалтерский учет строящихся объектов, в том числе с использованием программных продуктов, не осуществлялся. В декабре 2012 года приняты на работу два специалиста для целей ведения учета и своевременной передачи построенных объектов. Фондом представлены обязательства о полном восстановлении учета строящихся объектов в 2013 году.

Сведения о передаче Фондом на баланс исполнительных комитетов муниципальных образований и поселений законченных строительством и реконструкцией объектов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Год	Количество объектов, шт.	Количество исполнительных комитетов, принявших на баланс объекты	Стоимость переданных объектов (тыс. руб.)
2009	210	47	55 908,5
2010	264	49	46 027,8
2011	21	8	3 955,9
2012	341	46	90 486,3
Всего	836	150	196 378,5

Информация ОАО «УКС» о выполнении работ в 2011-2012 годах по водоснабжению представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатели	2011 г.	2012 г.	Итого
Финансирование, тыс. рублей	582 163	764 812	1 346 975
Количество объектов, всего, ед.:	94	149	243
Из них переходящие объекты с 2011 года		39	39
Построено и реконструировано водопроводных сетей, км	243,8	328	571,8
Установлено водонапорных башен, шт.	30	44	74
Пробурено скважин, шт.	41	44	85
Установлено колодцев, шт.	1 670	1 635	3 305
Установлено колонок, шт.	347	149	496
Установлено задвижек, шт.	888	729	1617
Установлено пожарных гидрантов, шт.	462	348	810

На момент проверки из запланированных на 2011-2012 годы 202 объектов водоснабжения используются для водоснабжения 112 объектов, на 73 объектах – работы не завершены и они не используются для водоснабжения (30 из них объекты 2011 года), на 17 объектах – работы не начаты. Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией имеются по 60 объектам водоснабжения.

Количество квартир, оборудованных газовыми котлами по Программе перехода на поквартирные системы отопления в муниципальных образованиях Республики Татарстан, представлено в таблице 4.

Таблица 4

№	Районы	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего, кв.
1	Агрызский	289	468	245	1 002
2	Азнакаевский	27	16	12	55
3	Аксубаевский	162	62		224
4	Алексеевский	82	66	824	972
5	Алькеевский		24		24
6	Альметьевский	67	334		401
7	Арский	193	453	1	647
8	Балтасинский			103	103

9	Бугульминский	289	1 217	340	1 846
10	Буинский	27	25	8	60
11	Верхнеуслонский		35	79	114
12	Высокогорский	700	492	147	1 339
13	Дрожжановский	9		11	20
14	Елабужский	368	237	114	719
15	Заинский	60	25	7	92
16	Зеленодольский	193	469	68	730
17	Камско-Устьинский	195	110		305
18	Кукморский	384	77	96	557
19	Лаишевский	353	79		432
20	Лениногорский	355		534	889
21	Мамадышский			50	50
22	Мензелинский	409			409
23	Менделеевский			152	152
24	Новошешминский	46		21	67
25	Пестречинский	127	150	1	278
26	Приволжский	26			26
27	Рыбно-Слободский	13	16	228	257
28	Сармановский	140	205	618	963
29	Сабинский			396	396
30	Советский	59			59
31	Спасский	33		52	85
32	Тетюшский			43	43
33	Тукаевский	57			57
34	Тюлячинский			14	14
35	Чистопольский	119	380	447	946
36	Ютазинский	108	140		248
ИТОГО:		4 890	5 080	4 611	1 4581

Сведения об устройстве наружных фасадных газопроводов приведена в таблице 5.

Таблице 5

Годы	2010	2011	2012	Всего
Протяженность, км	44,57	46,61	39,00	130,18

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ по 7 объектам на общую сумму 2 288,9 тыс. рублей. Подрядной организацией ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» предоставлено гарантийное письмо от 15.02.2013 № 338 на устранение выявленных завышений стоимости выполненных работ по вышеназванным объектам на общую сумму 2 069,1 тыс. рублей до 15.05.2013 года.

***ГУ «Управление капитального строительства
при Фонде газификации, энергосберегающих технологий***

и развития инженерных сетей Республики Татарстан»

ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (далее – ГУ «УКС») действует на основании Устава, утвержденного Генеральным директором ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан».

Целью деятельности ГУ «УКС» является обеспечение реализации государственной политики в области строительства, реконструкции, энергосбережения и технического перевооружения объектов газо-, тепло- и водоснабжения, производственного, коммунального и социально-культурного назначения.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а.

Штатная и фактическая численность составляет пять человек.

Балансовая стоимость основных средств уменьшилась за 2010-2012 годы на 46,8% и составила на 1 января 2013 года 2 451,7 тыс. рублей.

В составе запасов по состоянию на 01.10.2012 отражен остаток в сумме 118 823,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 240 581,4 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность (отраженная на счетах 60, 62 и 76) по состоянию на 01.10.2012 составляла 9 680,9 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 298 860,0 тыс. рублей.

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее – ОАО «УКС») действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №2690-р от 28.09.2011.

Функции учредителя ОАО «УКС» осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Целью деятельности ОАО «УКС» является получение прибыли.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а.

Штатная и фактическая численность составляет семьдесят четыре человека.

Балансовая стоимость основных средств увеличилась за 2012 год в 3,6 раза и составила на 1 января 2013 года 20 765,1 тыс. рублей.

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета (в части учета займов), которые были устранены в ходе проверки в полном объеме.

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.01.2013 составила 1 906 990,2 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 числится задолженность населения за установку двухконтурных котлов в сумме 1 269 185,0 тыс. рублей, в том числе задолженность уплаченная населением и не перечисленная своевременно жилищно-коммунальными предприятиями ЗАО «ЕРЦ» Елабужский района в сумме 429,1 тыс. рублей (2010 год), МУ «Департамент ЖКХ и Энергетики Елабужского района и г.Елабуги» – 392,6 тыс. рублей (2006-2010 годы), МУ «Управляющая компания» Заинского района – 249,2 тыс. рублей (2011 год), МУП «УК» Мензелинского района – 2 855,7 тыс. рублей (2011 год). Указанная задолженность ранее числилась на балансе ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» и передана в связи с планируемым прекращением его деятельности в ОАО «УКС».

Кредиторская задолженность ОАО «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 73 564,9 тыс. рублей.

Выводы

1. В 2010-2012 годах Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан бухгалтерский учет объектов капитальных вложений, в том числе с использованием программных продуктов, не осуществлялся.

2. По отдельным объектам установлено завышение стоимости выполненных работ общую сумму 2,3 млн. рублей.

3. ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» допущено образование просроченной дебиторской задолженности в общей сумме 9,7 млн. рублей.

4. В ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.

Предложения

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:

- представление в ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан»;
- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор



А.Р. Валеев
